




# बित्थडचिर गाउँपालिका देउलेख, बझाङ




# गाउँ पालिका सन्दर्भ....


- ▶ जयपृथ्वी राजमार्गको २१ कि.मी.
- ▶ अवस्थिति: यो गाउँपालिका  $80^{\circ}44.56''$   $80^{\circ}52.47''$  सम्म पूर्वी देशान्तर र  $२९^{\circ}२६'२८''$   $२९^{\circ}३४'२०''$  उत्तरी अक्षांशमा अवस्थित छ।
- ▶ बझाङ जिल्लाको दक्षिण पश्चिम भेगमा समुद्र सतह २६५९ फिटदेखि ८०५० फिटको उचाइमा रहेको
- ▶ वडाहरू: ९ वटा वडाहरूमा विभाजित
- ▶ सिमाना: उत्तरमा बुंगल नगरपालिका र केदारस्युँ, पूर्वमा बझाङकै केदारस्युँ भएर बग्ने कालङ्गा पश्चिममा बैतडी जिल्लाको पुरचौडी नगरपालिका दक्षिणमा बैतडी जिल्लाकै सिगास गाउँपालिका ।
- ▶ क्षेत्रफल: ८६.१५ वर्ग कि.मी
- ▶ जनसंख्या: १७१५४ (राष्ट्रिय जनगणना रिपोर्ट: २०६८)

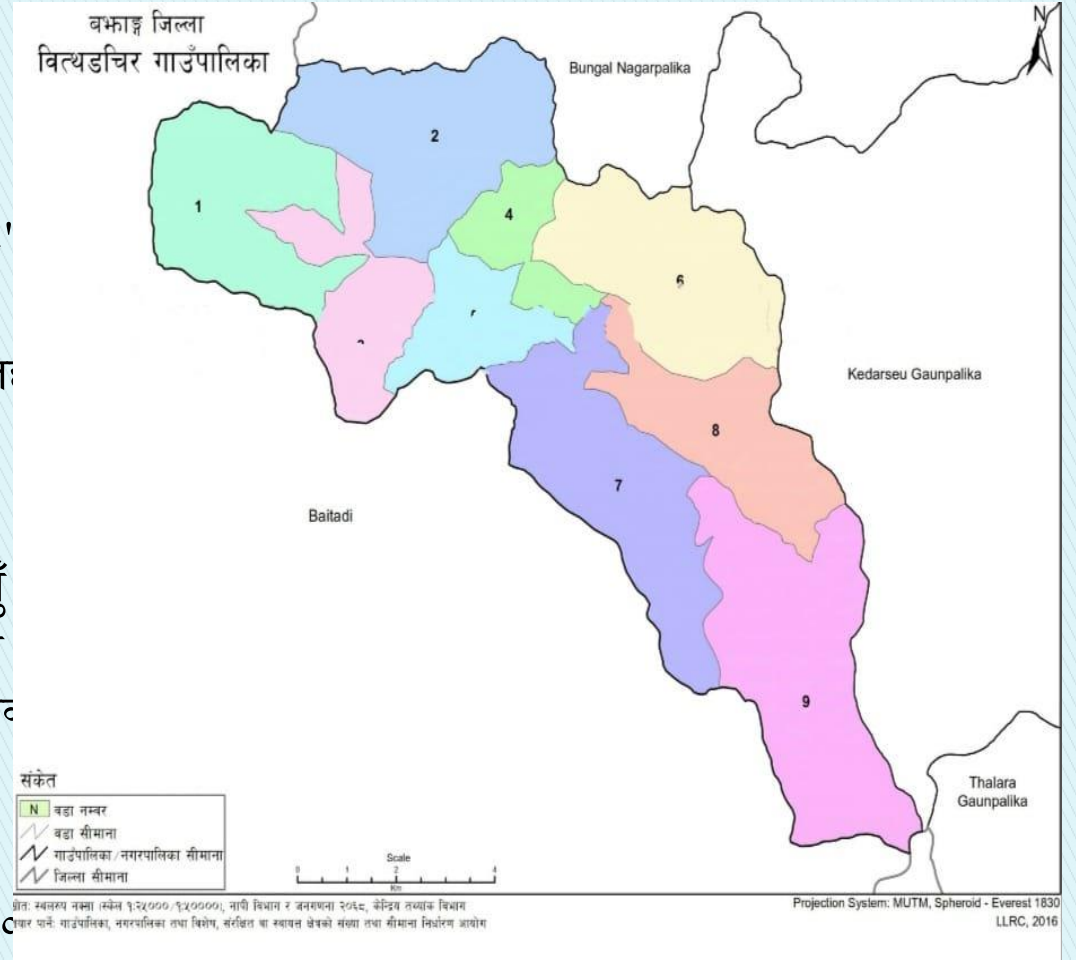

## संघ सरकारबाट प्राप्त बजेट, खर्च अवस्था समानीकरण तर्फ

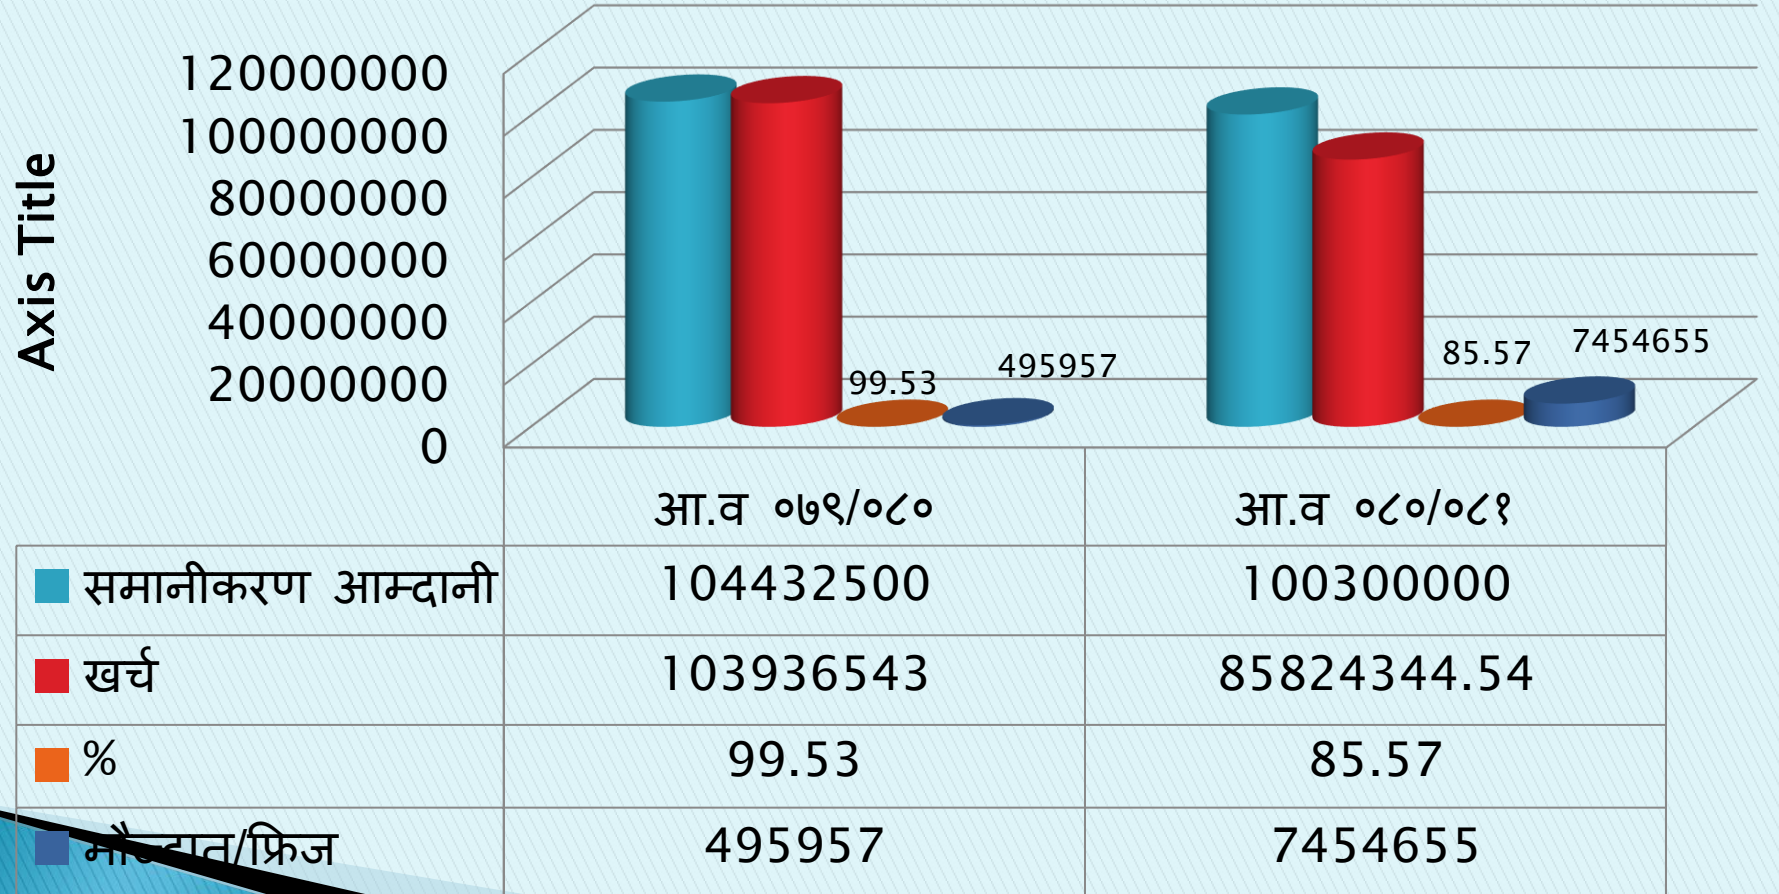


# शशर्त अनुदान तर्फ निकास भएकै बजेट तुलनात्मक अध्ययन/समीक्षा

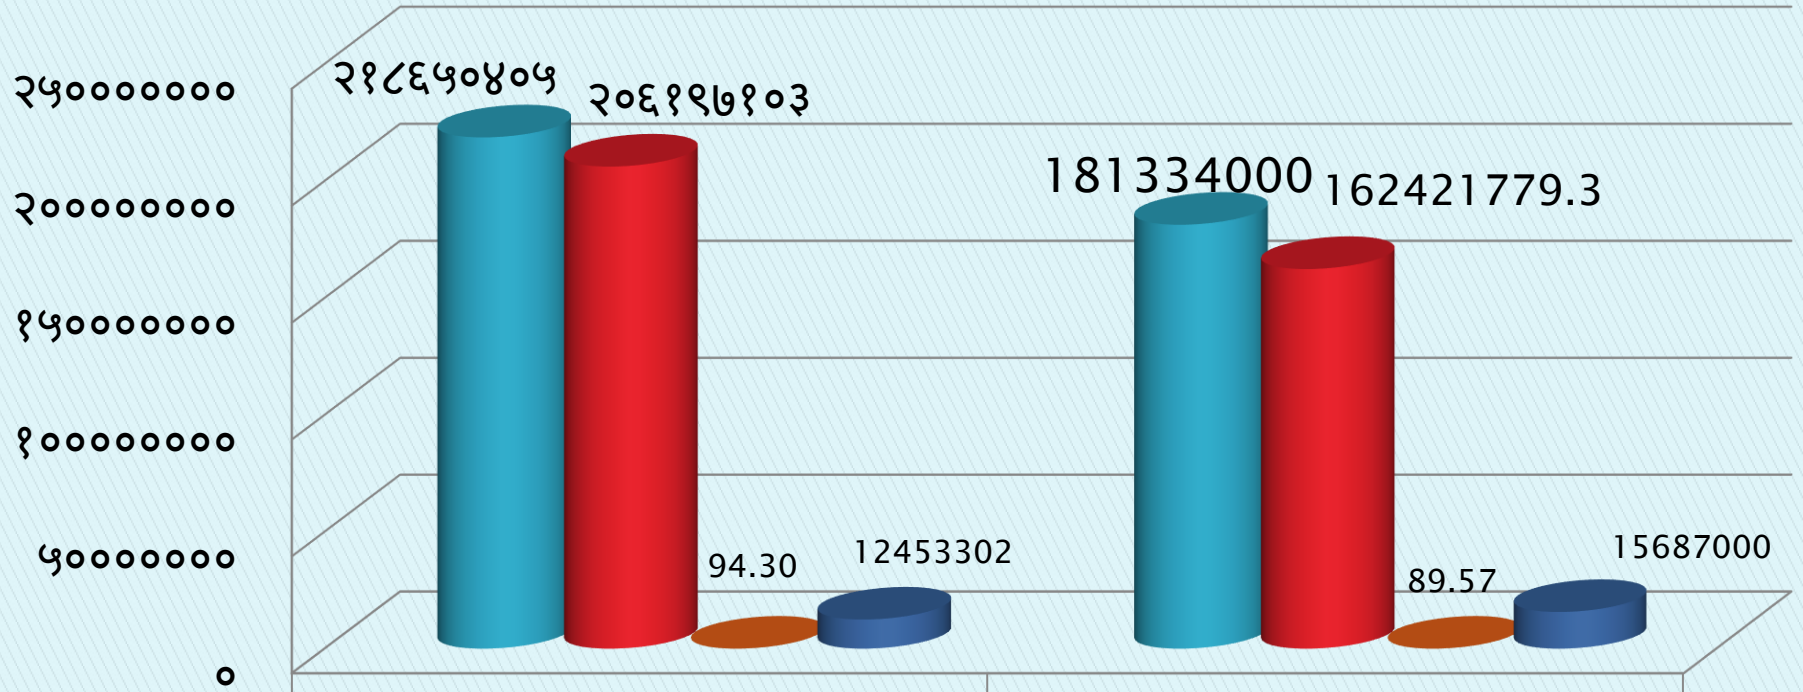


|                | आ.व ०७१ ०८० | आ.व ०८० ०८१ |
|----------------|-------------|-------------|
| ■ शशर्त अनुदान | २१८६५०४०५   | १८१३३४०००   |
| ■ खर्च         | २०६१९७१०३   | १६२४२१७७९.३ |
| ■ %            | ९४.३०       | ८९.५७       |
| ■ मौजदात/फ्रिज | १२४५३३०२    | १५६८७०००    |

## विशेष अनुदान तर्फको तुलनात्मक अध्ययन

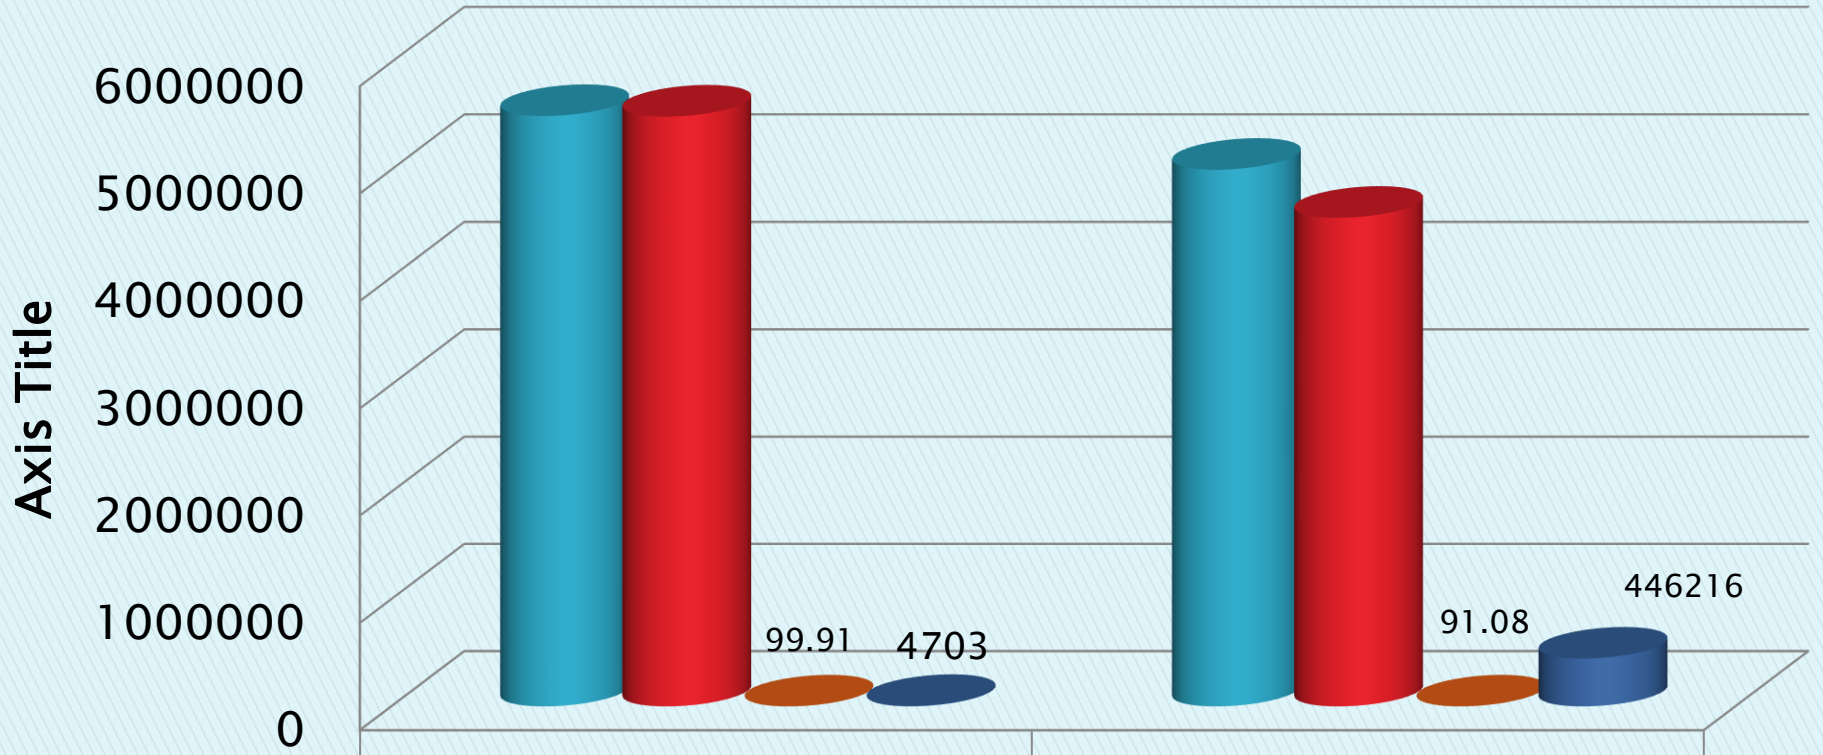

|                | आ.व ०७९।०८० | आ.व ०८०।०८१ |
|----------------|-------------|-------------|
| ■ विशेष अनुदान | 5500000     | 5000000     |
| ■ खर्च         | 5495297     | 4553784     |
| ■ प्रतिशतमा    | 99.91       | 91.08       |
| ■ विशेष        | 4703        | 446216      |


# आन्तरिक आय/राजस्व अवस्था

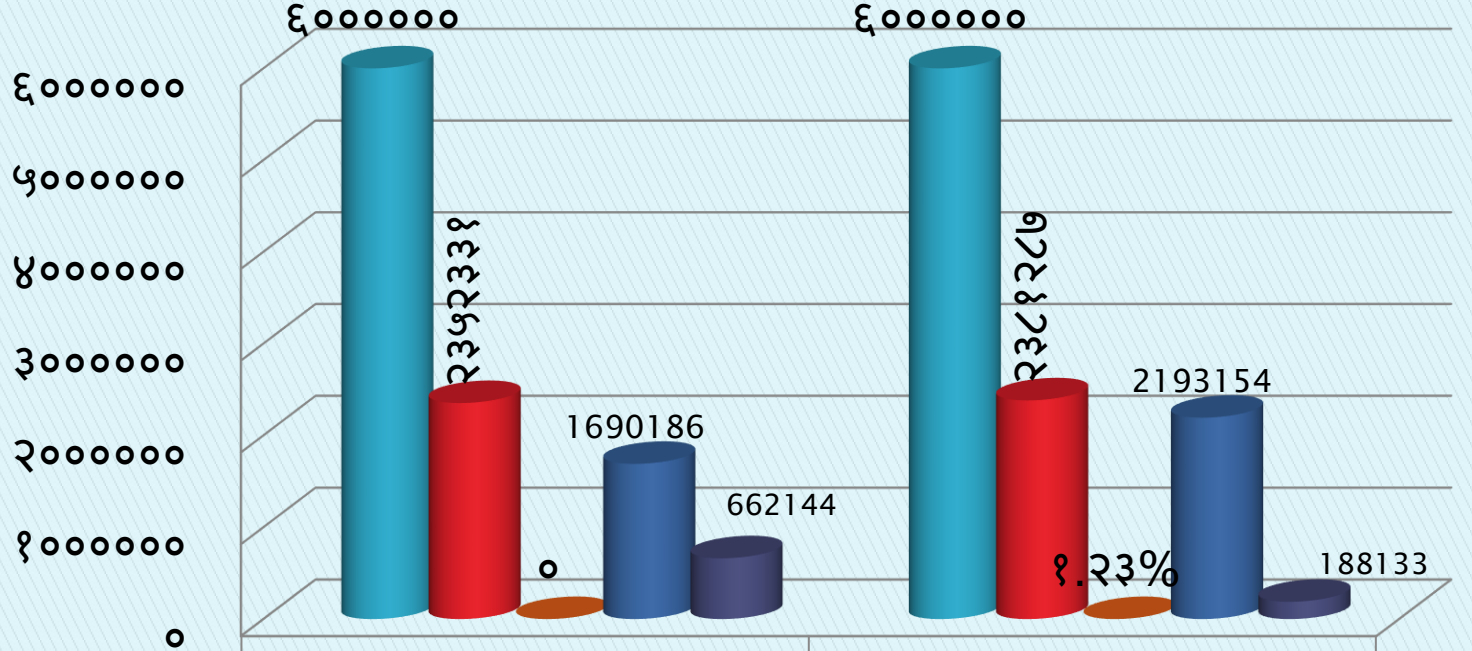

|                         |         |         |
|-------------------------|---------|---------|
| ■ आन्तरिक राजस्व अनुमान | ६०००००० | ६०००००० |
| ■ आम्दानी               | २३५२३३१ | २३८१२८७ |
| ■ राजस्व वृद्धि         | ०       | १.२३%   |
| ■ खर्च                  | १६९०१८६ | २१९३१५४ |
| ■ मौजदात                | ६६२१४४  | १८८१३३  |

# समपुरक अनुदान तर्फको अवस्था

विश्लेषणात्मक अध्ययन

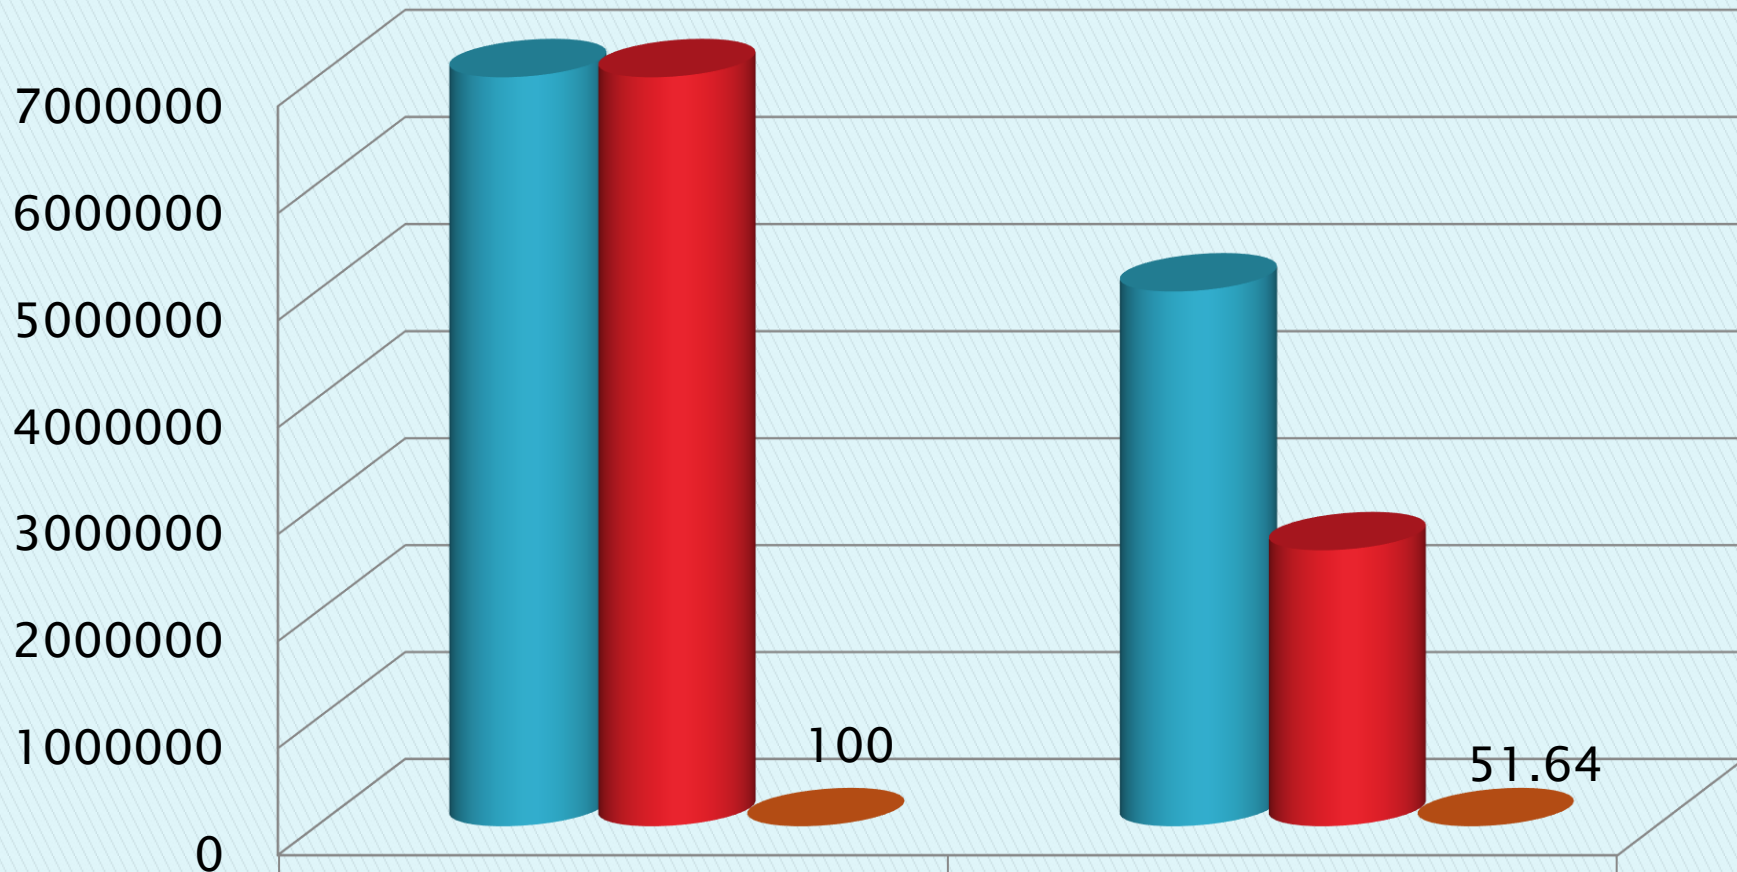


|               |         |
|---------------|---------|
| ■ समपुरक बजेट | 7000000 |
| ■ खर्च        | 7000000 |
| ■ खर्च %      | 100     |

| वर्ष        | समपुरक बजेट | खर्च    | खर्च % |
|-------------|-------------|---------|--------|
| आ.व ०७९।०८० | 7000000     | 7000000 | 100    |
| आ.व ०८०।०८१ | 5000000     | 2581953 | 51.64  |


# सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरित बजेट र खर्च अवस्थाको दुई आ.वको तुलनात्मक अवस्था

## प्रदेश समानीकरण तर्फ





# राजस्व अवस्था

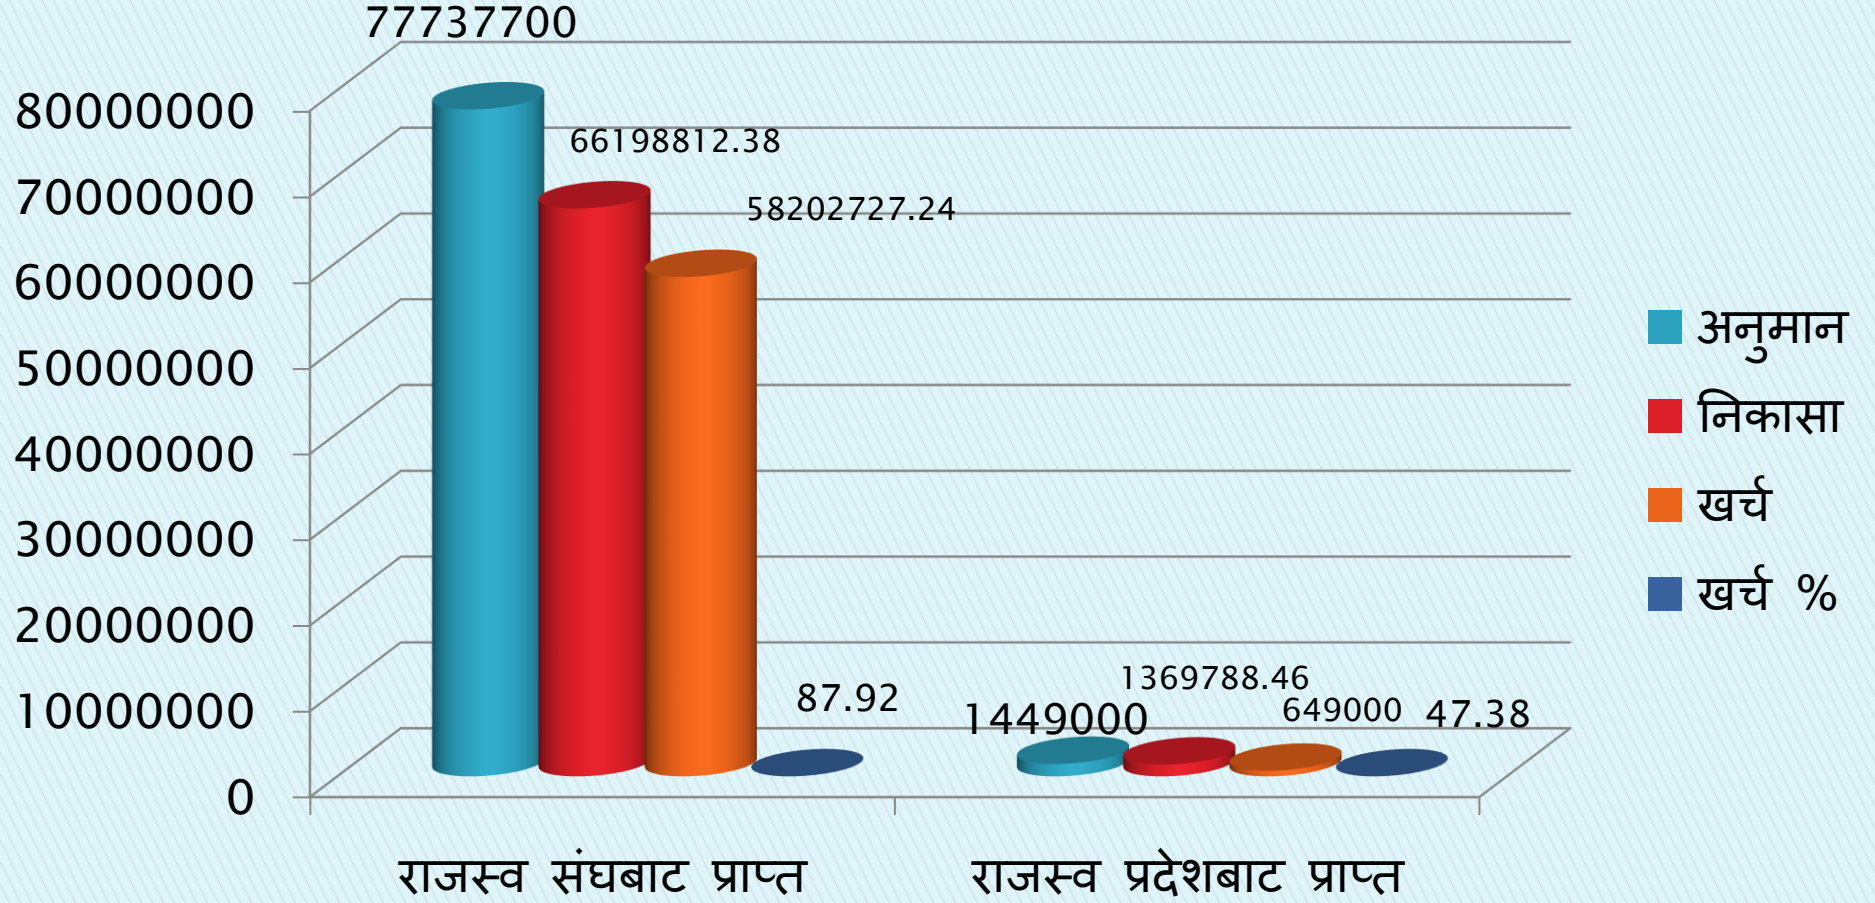

# अन्य आम्दानी र खर्च

## IPFMS/CGAS बाट निकासी भुक्तानी र खर्च

| बजेट शिर्षक  | जम्मा बजेट | खर्च        | निकासी/खर्च बाँकि |
|--|------------|-------------|-------------------|
| सामाजिक सुरक्षा                                    | १०३२२००००  | ९५३२३८०६    | ७८९६१९४           |
| एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम         | २९९५२०००   | २९९५१३८०.४३ | ६१९.५७            |
| प्रशासकीय भवन निर्माण कार्यक्रम                    | ५००००००    | ४९९६९००     | ३१००              |
| स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम                  | १०६००००    | १०६००००     | ०                 |
| शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय प्राविधिक धार | ३०५८३२     | ३०५८२३      | ०                 |
| राष्ट्रिय सुचना व्यवस्थापन तथा अनुगमन योजना        | १०००००     | ०           | १०००००            |
| पर्यटन पूर्वाधार आयोजना                            | ५७३९६०४    | ५५११४८०     | २२८१२४            |

# समग्र पालिकाको खर्च प्रतिशत-२०८०।०८१

|             | कुल बजेट     | निकास        | जम्मा खर्च   | खर्च प्रतिशत |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| चालु तर्फ   | ३३७६५१६६८.४७ | ३१५४४७२८८.०२ | २८७१३८७७५.१० | ८५.०३        |
| पूजिगत तर्फ | ६६६९३०००     | ६३८९०१४८.७६  | ५३०१३४२४     | ७९.४८        |
|             |              |              |              |              |
| कुल जम्मा   | ४०४३४४६६८.४७ | ३७९३३७४३६.७८ | ३४०१५२१९९.१० | ८४.१२        |

## संघीय र प्रदेश संचित कोषमा निकास फिर्ता र स्थानीय संचित कोषमा बैङ्क मौज्दात रकम

| निकास फिर्ता | शशर्त चालु  | शशर्त पूजिगत | प्रदेश चालु | जम्मा फिर्ता |
|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| रकम          | १६१२३६६५.६८ | २४१८०४७      | २००९९       | १८५६१८११.६८  |

## पालिकाको संचित कोषमा मौज्दात रकम

२०६२३४२६.१८

# आ.व २०८१।०८२ बित्थडचिर गापा. बजेट संक्षिप्तमा

| बजेट शीर्षक         | बजेट                      | कैफियत |
|---------------------|---------------------------|--------|
| संघीय समानीकरण      | १० करोड ३ लाख             |        |
| संघ राजस्व          | ८ करोड ८४ लाख ९९ हजार ९९९ |        |
| सशर्त अनुदान चालु   | १९ करोड ९६ लाख            |        |
| सशर्त अनुदान पुजिगत | ७३ लाख                    |        |
| विशेष अनुदान        | ८० लाख                    |        |

# आ.व २०८१।०८२ बित्थडचिर गापा. प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित

| बजेट शीर्षक                      | बजेट                   | कैफियत |
|----------------------------------|------------------------|--------|
| प्रदेश समानीकरण                  | ९० लाख ८५ हजार         |        |
| राजस्व                           | १४ लाख ५६ हजार         |        |
| सशर्त अनुदान चालु                | ८४ लाख                 |        |
| सशर्त अनुदान पुजिगत              | ७३ लाख                 |        |
| विशेष अनुदान                     | ६० लाख                 |        |
| समपुरक अनुदान                    | ८४ लाख ५० हजार         |        |
| जम्मा                            | २ करोड ८४ लाख २१ हजार  |        |
| कूल बजेट संघ र प्रदेशबाट प्राप्त | ४२ करोड ३८ लाख ६४ हजार |        |

भौतिक पूर्वाधार तथा वातावरण  
ब्यवस्थापन अन्तर्गत

आब २०८०/८१ मा निर्माण सम्पन्न  
भएका तथा निर्माणाधीन रहेका योजना  
तथा कार्यक्रमहरु

## उपभोक्ता समिति मार्फत:

- ▶ विनियोजित योजनाहरु: ९८
- ▶ सम्झौता भएका योजनाहरु: ९७
- ▶ सम्पन्न भएका योजनाहरु: ९६

# प्रतिस्पर्धा मार्फत कार्यान्वयन भएका आयोजना

- ▶ आयोजना संख्या: २
- ▶ निर्माण सम्पन्न: १
- ▶ निर्माणाधीन: १
- बाग्थाला धारी ग्रामिण सडक : आर्थिक प्रगति: ५१%
- : भौतिक प्रगति: ५५%
- झोलुंगे पुल फेब्रिकेशन सामग्री खरिद: सम्पन्न



# सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम

- ▶ सुरक्षित नागरिक आवास अन्तर्गत सम्झौता भइ आवास निर्माण भएका लाभग्राही: २२ जना
- ▶ निर्माण सम्पन्न भएका आवास: २२

# भूकम्प प्रभावित अस्थायी घर निर्माण

- ▶ सम्झौता भएका घर संख्या: ८
- ▶ निर्माण सम्पन्न भएका घर संख्या: ८

# संघीय समपुरक योजना

- ▶ जम्मा योजना संख्या: ३
- ▶ सुनकुडा धारी सडक निर्माण: निर्माणाधीन(आर्थिक प्रगति ४१%, भौतिक प्रगति ३८%)
- ▶ मल्लागाउँ सोलार लिफ्टिंग खानेपानी: निर्माणाधीन (आर्थिक प्रगति ६५%, भौतिक प्रगति ८०%)
- ▶ बाग्थाला धारी सडक निर्माण: निर्माणाधीन (आर्थिक प्रगति ७५%, भौतिक प्रगति ९०%)
- ▶ देउलेख मल्चिर पाडपाखा ग्रामिण सडक: निर्माण सम्पन्न

# प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम

- ▶ धारी आबी घेरबार निर्माण: निर्माण सम्पन्न
- ▶ सुनकुडा स्वास्थ्य चौकी प्रतिक्षालय: निर्माण सम्पन्न
- ▶ स्याडी स्वास्थ्य चौकी मर्मत: सम्पन्न
- ▶ साना सिचाई निर्माण कार्यक्रम:
  - ▶ १) देउलेख खेत सिचाई पोखरी निर्माण वडा न ५: निर्माण सम्पन्न
  - ▶ २) ठुला पन्यार सिचाई पोखरी मर्मत वडा न ६: निर्माण सम्पन्न
  - ▶ ३) ओछेना सिचाई कुलो मर्मत वडा नं ७: निर्माण सम्पन्न
  - ▶ ४) गोबिन्धधार छोयानी सिचाईकुलो वडा नं ८: निर्माण सम्पन्न
  - ▶ ५) घोडेगाडा सिचाईकुलो मर्मत वडा न ९: निर्माण सम्पन्न

# गाउँपालिका भित्र बिद्युत प्राधिकरण संगको लागत सहकार्यमा बिधुतिकरण



गाउँपालिका भित्र बिद्युत  
बिस्तार योजना अन्तर्गत  
बिभिन्न बस्तीमा बिद्युत  
उद्घाटनका तस्बिरहरु



# संघीय सरकार बाट प्राप्त बहु बर्षिय शसर्त अनुदान

- ▶ एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत १५ शैया अस्पताल भवन निर्माण
- ▶ आर्थिक प्रगति: २८.९२%
- ▶ भौतिक प्रगति: ३८%



# १२० घर धुरीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन निर्माण सम्पन्न भएको मल्लागाउ सोलार लिफ्टिंग खानेपानी आयोजना-वाड नं ३



# संघीय सशर्त पुजीगत अनुदान अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न झोलुंगे पुल

मौभेरी मैतल झोलुंगे पुल  
आर्थिक प्रगती: ८०%  
भौतिक प्रगती: १००%





# आब २०८०/८१ मा निर्माण भएका ग्रामिण सडक विवरणः

- ▶ १) बाग्थाला धारी ग्रामिण सडकः २.५ किमी
- ▶ २) खुल्मौर ओशैल ग्रामिण सडकः १.३ किमी
- ▶ ३) बित्थड भाराबिड ग्रामिण सडकः १.२ किमी
- ▶ ४) बित्थड गुरुबगड ग्रामिण सडकः ०.८ किमी
- ▶ ५) देउलेख धामिगाउ ग्रामिण सडकः ०.९ किमी
- ▶ ६) सुनकुडा मर्घुन ग्रामिण सडकः ०.५ किमी
- ▶ ७) रैकोशी बैतडी ग्रामिण सडकः १.५ किमी

आब २०८०/८१ मा थपिएको कुल सडक लम्बाईः ८.७  
किमी

# आब २०८०/८१ मा निर्माण भएका सिचाई आयोजना:

- ▶ १) देउलेख खेत सिचाई पोखरी निर्माण वडा नं ५
- ▶ २) ठुला पन्यार सिचाई पोखरी मर्मत वडा नं ६
- ▶ ३) ओछेना सिचाई कुलो मर्मत वडा नं ७
- ▶ ४) गोबिन्दधार सिचाई कुलो निर्माण वडा नं ८
- ▶ ५) घोदेगडा सिचाई कुलो निर्माण वडा नं ९

# बजार अनुगमन



निर्माण ब्यबसायी तथा उपभोक्ता समिती मार्फत निर्माण गरिने भौतिक पुर्बाधारका आयोजनाको गुणस्तर परिक्षणका लागि ल्याब स्थापना तथा परिक्षण सुरु गरिएको



# असल पक्षहरु

- ▶ नागरिकको घरदैलोमै सेवा प्रवाह
- ▶ संविधानको मर्म अनुरूप संघीयताको कार्यान्वयन ।
- ▶ नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिकको अभ्यास ।
- ▶ विकेन्द्रिकरणको अवधारणा अनुसार वस्तिस्तरबाट योजनाबद्ध विकासको प्रयास ।
- ▶ आयोजनाको गुणस्तर परिक्षणका लागि ल्याब स्थापना

# समस्या/ चुनौति

- ▶ Real Database मा आधारित बजेट व्यवस्थापन:
- ▶ योजनाबद्ध विकास अवधारणाको अभाव
- ▶ Networking
- ▶ भुगोल:
- ▶ जनशक्ति व्यवस्थापन:

हजुरहरुको केहि जिज्ञासा !

र

सुझाव

धन्यवाद
